PROCES VERBAL DE CONTROLE

Client : ESSILOR SUN SOLUTION

N° FAB : B2799A

CONSTRUCTION : MECANIQUE

TYPE : BT 150°

Dimensions intérieures - largeur x hauteur x profondeur : 2000x2090x700

Calorifuge : 120 ☐ 250 ☐ autres ☒ 60mm

Tôlerie intérieure : XOAL ☒ XOZ ☐ INOX ☐ Autre : _____

Protection extérieure Standard SAT

Couleur spéciale : sable 42

Qualité spéciale : ral 3020

Plancher : 120 ☐ 27 ☐ Autres : sans

Porte : Nombre : 1 Battant : 2 Charnières à droite ☒ à gauche ☒

Guillotine ☐ Autres : _____

Joint étanchéité Silicone standard ☐ Fibre réfractaire standard ☒ Autres : _____

Prise d'aspiration Nombre : 1 Dimensions : 100

Commande directe : ☒

Tirette : ☐

Motorisée : ☐

Filtre d'aspiration : Standard 250 microns ☐ Autres : _____

Prise d'extraction Nombre : 1 Dimensions : 100

Commande directe : ☒

Tirette : ☐

Motorisée : ☐

Ventilateur d'extraction Nombre : Type : Construction :

Cheminée : Non fournie ☒ Fournie ☐

Ventilateur de recyclage Nombre : 1 Type : 1.5KW Montage : NAM Refroidisseur : OUI

Construction Arbre long

Chauffage Electrique : ☒ Nombre E.C. : 6X4 Puissance : 24KW/THYRISTORS

Brûleur : ☐ Combustible : _____

Marque : _____ Type : _____ Puissance : _____

Recyclage direct ☒ Echangeur : ☐ Clapet tirage : ☐

Batterie chauffage ☐ Fluide : ☐

EQUIPEMENT ELECTRIQUE

Armoire de commande 800x600x300

Étanchéité IP _____ Couleur

Ventilation naturelle ☐

Ventilation forcée ☒

Position à droite ☒ à gauche ☐ Autre ☐

Tableau de commande sur porte ☐ côté droit ☐ côté gauche ☐ Autre : _____

Tension d'alimentation 220 V tri ☐ 380 tri ☒ Autre : ☐

Calibre sectionneur Interrupteur calibre : 63A Puissance transfo télécommande : 160VA

Tension télécommande : 24 V ☐ 48 V ☐ 110 V ☒ 220 V ☐ Autre : _____

Régulation TMS EROELECTRONIQUE Sonde : J

Enregistreur _____ Sonde : _____ Papier rouleau ☐ Accordéon ☐ Disque ☐

Option minuterie ☒ horloge ☒ Régulateur sécurité ☒ FUJI Autre : ☐

Plaque firme ☒	Plaque signalétique ☒	Plaque conformité ☒
Rédacteur : J. MARTIN	Visa	CONTROLE QUALITE :
Date : 23/03/2016		Visa responsable :

IMP : 09.06.0

ESSAIS

Calibre CC sectionneur : Interrupteur : ☒ Tension d'alimentation 400V

Tension transfo. télécommande : 120V


Calibre CC primaire transfo. : 1A Secondaire transfo : 2A

Calibre CC chauffage : 40A GL

Calibre disjoncteur moteur GV : 2.5-4A Réglage : 3.4A

Moteur extraction :

Ventilateur de recyclage : Relevé à froid - intensité et vitesses efficaces de vibration



N° MOTEUR	P kW	I. nom. A	I.mesuré A	Vibration 1	mm/s 2	(maxi 3	: 7,1) 4
WEG	1.5	3.4	2.4				

Intensité EC à puissance maxi : 37A Branchement EC : ETOILE

Contrôle section conducteurs : OK Chauffage ☒ Moteur : ☒


Température d'essais : 80° Régulation : OK

Minuterie : ☒ Horloge : ☒ Régulateur de sécurité : ☒ Enregistreur : ☐

Paramètres régulation : XP : 2% CAS : Ti : 3 Td : 30 Cy : 1

Butées de régulation : 150° Régulateur de sécurité : 160°

Températures (°C)

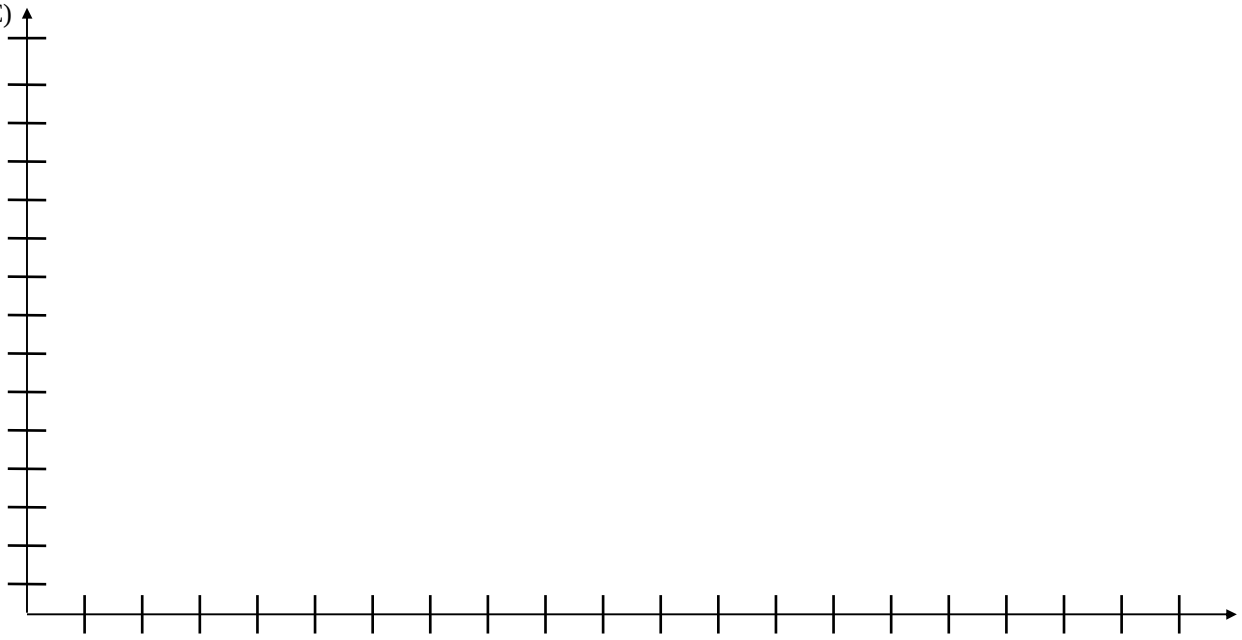

OBSERVATIONS

Temps (H)

IMP : 09.06.0
